



**Studio Tecnico Geom. Lucio Montalenti**  
Via Gnifetti n.11/e – 28100 Novara  
Tel. 3355457454 mail : lucio.montalenti@geopec.it

## **PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO** **“NUOVA R.S.A.”**



|     |            |                       |           |       |
|-----|------------|-----------------------|-----------|-------|
|     |            |                       |           |       |
|     |            |                       |           |       |
|     |            |                       |           |       |
| 1   | 09.09.2019 | PRIMA EMISSIONE       | CSP       |       |
| REV | DATA       | DESCRIZIONE REVISIONE | REDAZIONE | Firma |

Geom. Montalenti Lucio



**PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**

(2.1.1)\*

*Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità, conforme alle prescrizioni dell'art.15 del d.lgs. n. 81/2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il CSP*

**IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA**

(2.1.2)\*

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indirizzo del cantiere</b><br>(a.1)                                                                                                            | Ex area sportiva campo da calcio - Comune di Grignasco Area compresa tra Largo Ferrari, Via Pastore, Via Dei Partigiani e la futura strada prevista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere</b><br>(a.2)                                                                    | <p>L'appalto ha per oggetto la costruzione della Nuova R.S.A. in Comune di Grignasco per anziani non autosufficienti per un totale di 70 posti letto, destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti che non necessitano comunque di specifiche prestazioni ospedaliere.</p> <p>L'appalto comprende la realizzazione completa di tutto lo stabile con tutti le opere di rifinitura interne ed esterne.</p> <p>Inoltre viene compresa la realizzazione di un nuovo parcheggio destinato ad uso pubblico in prossimità della nuova struttura.</p> <p>L'edificio si svilupperà su 2 piani fuori terra, localizzato nel comune di Grignasco (No)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descrizione sintetica dell'opera con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche</b><br>(a.3) | <p>La struttura adibita ad RSA sarà oggetto di nuova costruzione di edificio destinato a RSA, all'interno della struttura le camere sono dotate di servizi igienici attrezzati di tutti gli apparecchi sanitari e del necessario (arredi ed ausili) per l'utilizzo dei medesimi da parte di persone diversamente abili. Nella struttura sono presenti spazi comuni per il soggiorno, sala tv, sala da pranzo, sala per riabilitazione, cucina e magazzino derrate, deposito biancheria, bagno assistito, locale capo sala, infermeria e sala medici.</p> <p>Nelle immediate vicinanze all'ingresso sono presenti la direzione e la segreteria oltre alla reception, quest'ultima in locale dedicato con sportello informazioni e controllo accessi.</p> <p>I collegamenti verticali sono garantiti sia da scale che da impianti ascensore.</p> <p><b>Impianti:</b> La struttura è dotata di impianto di rilevazione incendi con centralina allarmi collocata al piano terreno, presso la reception.</p> <p>Le uscite di sicurezza sono munite di impianto di allarme al fine di evitare l'uscita non controllata dei pazienti. La camera mortuaria è munita di impianto di raffrescamento.</p> <p>I locali tecnici quali la centrale termica, il locale pompe antincendio, sono ubicati rispettivamente su area esterna in fabbricato dedicato ed al piano seminterrato con accesso indipendente da area esterna. La produzione di acqua calda per il riscaldamento dei locali è costituito da generatore di calore funzionante a gas</p> <p><b>Area esterna:</b> L'area esterna dell'edificio è costituita da percorsi carrai ed aree di manovra pavimentati con asfalto. L'accesso principale è garantito da un cancello carrai ed uno pedonale.</p> <p>Attorno all'edificio, l'area esterna è costituita da giardino ed aree di passeggio per consentire una fruibilità e deambulazione da parte degli ospiti.</p> <p>Nell'area aperta interna al fabbricato, sono presenti zone verdi e percorsi pedonali.</p> <p>In particolare le lavorazioni descritte per le fasi di sicurezza sono dettagliate nella Relazione Tecnico illustrativa (all.1)</p> <p>Inoltre sarà realizzato un nuovo parcheggio comunale ed uso pubblico in prossimità della nuova struttura.</p> |

## P.S.C. NUOVA COSTRUZIONE R.S.A. - Comune di Grignasco

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza<br>(b) | <b>Proponente : Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale ONLUS</b><br>cognome e nome:<br>indirizzo: via Baveno 4 – 28100 Novara<br><br>Responsabile dei lavori (se nominato):<br>cognome e nome<br><br><b>Coordinatore per la progettazione:</b><br>cognome e nome: Geom. Lucio Montalenti<br>indirizzo: via Gnifetti n. 11/c<br>tel.: 0321.611673 uff. 335.5457454 cell.<br>mail.: lucio.montalenti@geopec.it<br><br><b>Coordinatore per l'esecuzione:</b><br>cognome e nome: Geom. Lucio Montalenti<br>indirizzo: via Gnifetti n. 11/E<br>tel.: 0321.611673 uff. 335.5457454 cell.<br>mail.: lucio.montalenti@geopec.it |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

(2.1.2 b)\* (Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati)


| IMPRESA AFFIDATARIA N.: verrà indicata ad affidamento lavori                      |                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dati identificativi                                                               | Attività svolta in cantiere dal soggetto | Soggetti incaricati per l'assolvimento dei compiti ex art. 97 in caso di subappalto |
| Nominativo:<br>indirizzo:<br>cod.fisc.:<br>p.iva:<br>nominativo datore di lavoro: |                                          | Nominativo:<br>Mansione:                                                            |

| IMPRESA AFFIDATARIA ed ESECUTRICE N.: verrà indicata ad affidamento lavori        |                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dati identificativi                                                               | Attività svolta in cantiere dal soggetto | Soggetti incaricati per l'assolvimento dei compiti ex art. 97 in caso di subappalto |
| Nominativo:<br>indirizzo:<br>cod.fisc.:<br>p.iva:<br>nominativo datore di lavoro: |                                          | Nominativo:<br>Mansione:                                                            |

| IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.: verrà indicata ad affidamento lavori       |                                          |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Dati identificativi                                                               | Attività svolta in cantiere dal soggetto |                              |
| Nominativo:<br>indirizzo:<br>cod.fisc.:<br>p.iva:<br>nominativo datore di lavoro: |                                          | Affidataria di riferimento : |

| LAVORATORE AUTONOMO N.:                           |                                          |                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Dati identificativi                               | Attività svolta in cantiere dal soggetto |                                                    |
| Nominativo:<br>indirizzo:<br>cod.fisc.:<br>p.iva: |                                          | Eventuale impresa riferimento se subaffidatario: : |

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

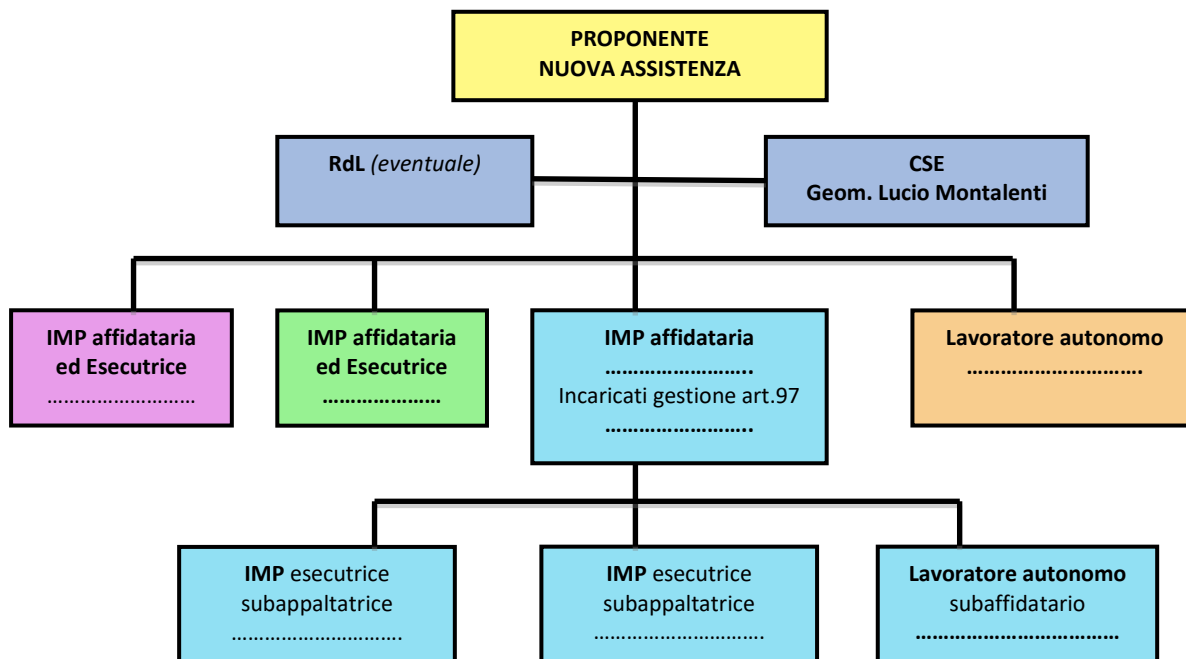

## P.S.C. NUOVA COSTRUZIONE R.S.A. - Comune di Grignasco

### INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL'AREA DI CANTIERE

(2.1.2 d.2; 2.2.1; 2.2.4)\*

(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

| CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE                                                                                                 | SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE               | PROCEDURE               | MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE                                   | TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI | MISURE DI COORDINAMENTO                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DALL'ESTERNO VERSO IL CANTIERE E VICEVERSA</b>                                                                                     |                                                   |                         |                                                                  |                                      |                                                                                       |
| FALDE                                                                                                                                 | Verificare la presenza e attenersi alle procedure | Segnalare alla DL       |                                                                  |                                      |                                                                                       |
| FOSSATI                                                                                                                               |                                                   |                         |                                                                  |                                      |                                                                                       |
| ALBERI                                                                                                                                | Verificare la presenza e attenersi alle procedure | Segnalare alla DL - CSE | Eventuale taglio se necessario per messa in sicurezza            |                                      | Segnalare la zona durante le operazioni di taglio e emessa in sicurezza aerea a verde |
| ALVEI FLUVIALI                                                                                                                        | Non presenti                                      |                         |                                                                  |                                      |                                                                                       |
| BANCHINE PORTUALI                                                                                                                     | Non presenti                                      |                         |                                                                  |                                      |                                                                                       |
| RISCHIO DI ANNEGAMENTO                                                                                                                | Non presenti                                      |                         |                                                                  |                                      |                                                                                       |
| MANUFATTI INTERFERENTI O SUI QUALI INTERVENIRE                                                                                        |                                                   |                         |                                                                  |                                      |                                                                                       |
| INFRASTRUTTURE:<br>STRADE<br>FERROVIE<br>IDROVIE<br>AEROPORTI                                                                         | Non presenti                                      |                         |                                                                  |                                      |                                                                                       |
| LAVORI STRADALI E AUTOSTRADALI AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA E SALUTE NEI CONFRONTI DEI RISCHI DERIVANTI DAL TRAFFICO CIRCOSTANTE | Non presenti                                      |                         |                                                                  |                                      |                                                                                       |
| EDIFICI CON ESIGENZE DI TUTELA:<br>SCUOLE<br>OSPEDALI<br>CASE DI RIPOSO<br><b>ABITAZIONI X</b>                                        | Verificare la presenza e attenersi alle procedure | Segnalare alla DL e CSE | Se installata gru evitare sbraccio nelle zone verso abitazioni.  |                                      |                                                                                       |
| LINEE AREE                                                                                                                            | Verificare la presenza e attenersi alle procedure | Segnalare alla DL e al  | Installare barriere di protezione oppure attenersi alle fasce di |                                      | Segnalare la zona e delimitarla                                                       |

## P.S.C. NUOVA COSTRUZIONE R.S.A. - Comune di Grignasco

| CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE | SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE               | PROCEDURE        | MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE                                                     | TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI | MISURE DI COORDINAMENTO                                                          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                   | CSE              | rispetto delle norme CEI                                                           |                                      |                                                                                  |
| CONDUTTURE SOTTERRANEE DI SERVIZI     | Verificare la presenza e attenersi alle procedure |                  |                                                                                    |                                      |                                                                                  |
| VIALBILITA'                           | Attenersi alla procedure                          |                  |                                                                                    |                                      |                                                                                  |
| INSEDIAMENTI PRODUTTIVI               | Non presenti                                      |                  |                                                                                    |                                      |                                                                                  |
| ALTRI CANTIERI                        | Evitare la compresenza di cantieri ravvicinati.   | Segnalare al CSE | Delimitare le aree evitando le interferenze per gli accessi e fornitura materiali. |                                      | Riunione preliminare di coordina veto verifiche in sito                          |
| ALTRO <i>(descrivere)</i>             |                                                   |                  |                                                                                    |                                      |                                                                                  |
| RUMORE                                | parziale                                          |                  | Rispetto delle fasce di orari dei riposi                                           |                                      |                                                                                  |
| POLVERI                               | parziale                                          |                  | Pulizia continua e aspirazione                                                     |                                      |                                                                                  |
| FIBRE                                 | no                                                |                  |                                                                                    |                                      |                                                                                  |
| FUMI                                  | no                                                |                  |                                                                                    |                                      |                                                                                  |
| VAPORI                                | no                                                |                  |                                                                                    |                                      |                                                                                  |
| GAS                                   | no                                                |                  |                                                                                    |                                      |                                                                                  |
| ODORI                                 | no                                                |                  |                                                                                    |                                      |                                                                                  |
| INQUINANTI AERODISPERSI               |                                                   |                  |                                                                                    |                                      |                                                                                  |
| CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO         | Solo per lavori esterni                           |                  | Predisporre coperture di protezione agli accessi.                                  |                                      | Cartellonistica con eventuali percorsi alternativi per i lavoratori RSA e utenti |
| ALTRO <i>(descrivere)</i>             |                                                   |                  |                                                                                    |                                      |                                                                                  |

## P.S.C. NUOVA COSTRUZIONE R.S.A. - Comune di Grignasco

### ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

(2.1.2.d 2; 2.2.2, 2.2.4)\*

(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

| ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE                                                                                                                                                                 | SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE                                                                                                                                         | PROCEDURE | MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE                                           | TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI | MISURE DI COORDINAMENTO                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| MODALITA' DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE, GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI DEL CANTIERE                                                                                                          | Recinzione delle aree cantieristiche individuate nelle planimetrie allegate (AII.2) con rete PVC di colore arancione                                                        |           | Mantenere in efficienza e buono stato di manutenzione la recinzione.     |                                      |                                                                                    |
| SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI                                                                                                                                                              | Installare dei baraccamenti provvisori in area concordata con la DL e il CSE, in alternativa mettere a disposizione del cantiere un area Wc e locali già esistente in sito. |           | Mantenere condizioni igieniche.                                          |                                      |                                                                                    |
| VIABILITA' PRINCIPALE DI CANTIERE                                                                                                                                                           | Da valutare all'atto dell'inizio cantiere con la DL e il CSE                                                                                                                |           | Evitare il rischio di investimento ed incidenti con i mezzi in ingresso. |                                      | Attenersi al rispetto della viabilità prestabilita rispettare i limiti di velocità |
| IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITA', ACQUA, GAS E ENERGIA DI QUALSIASI TIPO                                                                                         | Seguire le indicazioni della DL per la individuazione della presenza degli impianti                                                                                         |           | se trovate durante esecuzione dei lavori segnalare alla DL e CSE         |                                      | Valutare l'interferenza ed eventualmente la messa fuori servizio temporanea.       |
| IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE                                                                                                                           | Con squadra elettrica valutare installazione di impianto di messa a terra.                                                                                                  |           |                                                                          |                                      |                                                                                    |
| DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA CONSULTAZIONE DEI RLS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |           |                                                                          |                                      |                                                                                    |
| DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE TRA I DATORI DI LAVORO, IVI COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI, DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' NONCHE' LA LORO RECIPROCA INFORMAZIONE |                                                                                                                                                                             |           |                                                                          |                                      | Coinvolgimento nelle riunioni di coordinamento per la programmazione dei lavori    |
| MODALITA' DI ACCESSO DI MEZZI PER LA FORNITURA DEI MATERIALI                                                                                                                                | Rispettare la viabilità di cantiere e le procedure stabilite dalle RSA                                                                                                      |           |                                                                          |                                      |                                                                                    |
| DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE                                                                                                                                                     | Valutare in loco in riunione di coordinamento sentito il parere della DL                                                                                                    |           |                                                                          |                                      |                                                                                    |

## P.S.C. NUOVA COSTRUZIONE R.S.A. - Comune di Grignasco


| ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE                                            | SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE                                      | PROCEDURE | MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE | TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI | MISURE DI COORDINAMENTO |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E SCARICO                            | Valutare in loco in riunione di coordinamento sentito il parere della DL |           |                                |                                      |                         |
| ZONE DI DEPOSITO DI ATTREZZATURE E DI STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI   | Valutare in loco in riunione di coordinamento sentito il parere della DL |           |                                |                                      |                         |
| ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON PERICOLO D'INCENDIO O DI ESPLOSIONE | Valutare in loco in riunione di coordinamento sentito il parere della DL |           |                                |                                      |                         |
| ALTRO <i>(descrivere)</i>                                              |                                                                          |           |                                |                                      |                         |

(\*) Di ognuno dei punti individuati deve essere data evidenza nelle planimetria di cantiere

(\*\*) le tavole esplicative verranno allegate prima dell'inizio dell'appalto.

**SI VUOLE SOTTOLINEARE CHE OGNI ATTIVITA' ESEGUITA VERRA' DELIMITATA E ACCESIBILE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ALLE PERSONE ADDETTE ALLE OPERAZIONI. TALI INTERVENTI VERRANNO COORDINATI AFFINCHE TUTTI I RISCHI VENGANO RISOLTI**

## PLANIMETRIA GENERALE

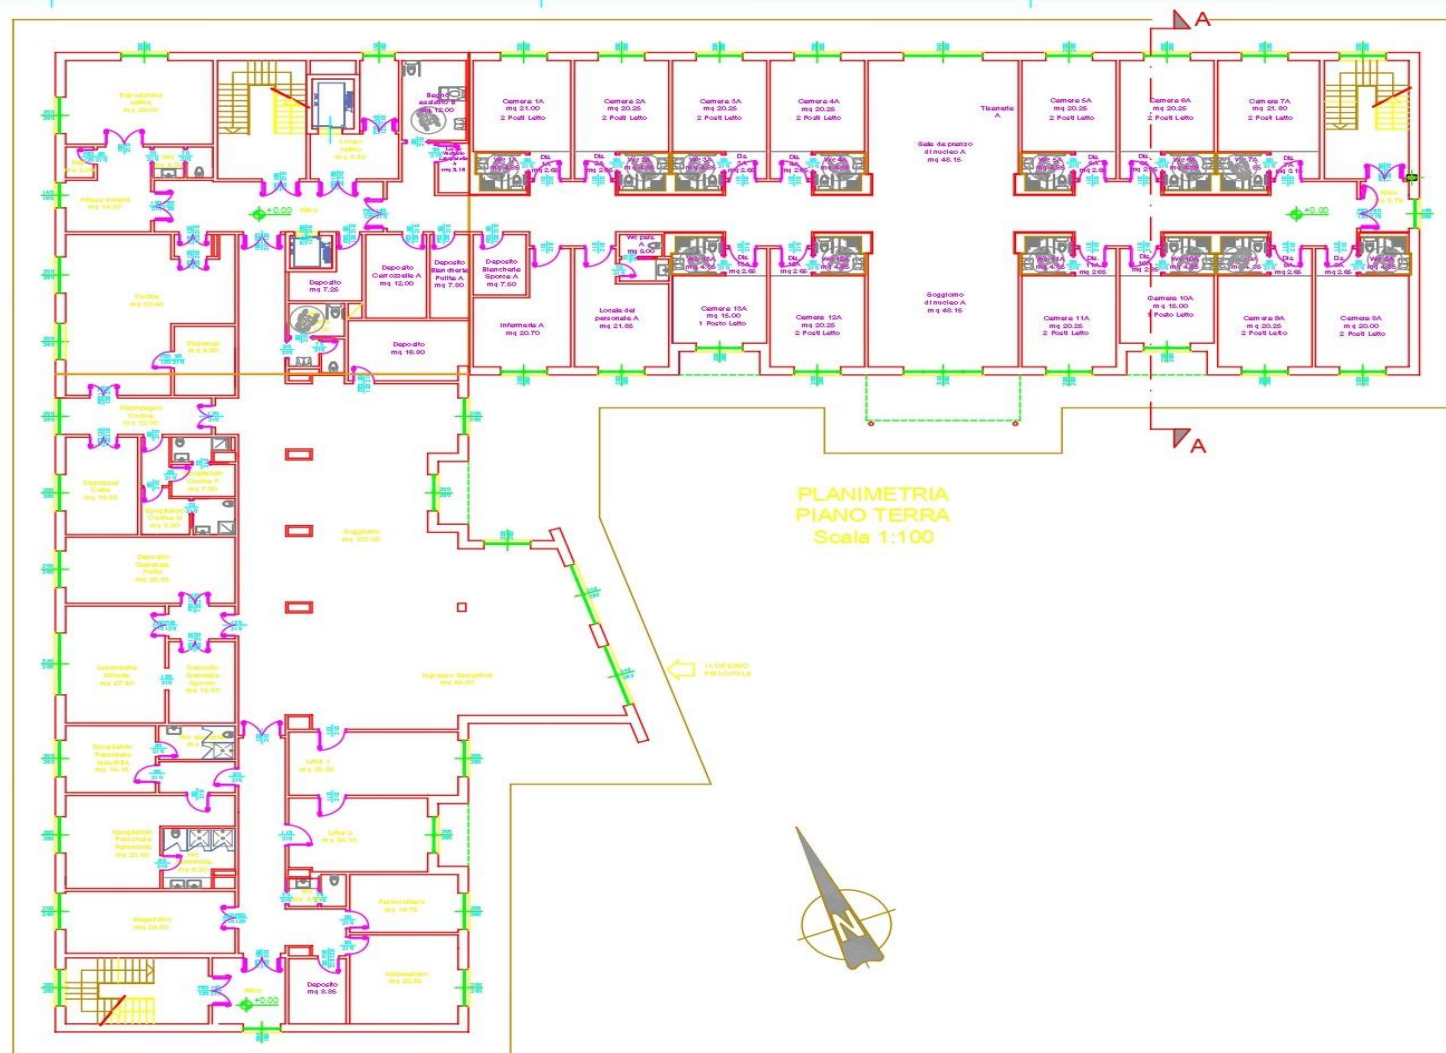

## **P.S.C. NUOVA COSTRUZIONE R.S.A. - Comune di Grignasco**

**Note:** Tenuto conto che i lavori coinvolgeranno L'AREA della RSA e che attualmente trattasi di PSC generale con prime indicazioni le planimetrie di dettaglio per ogni porzione di cantiere verranno allegate successivamente.

### **RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI (2.1.2.d 3; 2.2.3; 2.2.4)\***

I rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all'allegato XI del decreto 81/08, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell'allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri delle attività delle singole imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3). Andrà compilata una scheda per ogni lavorazione, analizzando tutti gli elementi della prima colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui la scheda si riferisce.

## P.S.C. NUOVA COSTRUZIONE R.S.A. - Comune di Grignasco

### PROCEDURE DI SICUREZZA DELLE FASI LAVORATIVE

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione della fase             | ALLESTIMENTO DEL CANTIERE<br>Accesso al cantiere, allocazione attrezzature di cantiere (betoniera, ecc), installazione servizi per il personale, predisposizione dei depositi temporanei e permanenti, realizzazione degli impianti di cantiere (acqua, fogna, elettricità) segnaletica di cantiere, presidi sanitari ed antincendio              |
| Contemporaneità con la/le fase/i   | Nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Attrezzature adoperate             | Pala, piccone, mazza, attrezzi di uso comune (secchi, mazzette, cazzuole, martello, pinze, tenaglie, chiavi), autocarro, scale a mano semplici o doppie, martello demolitore                                                                                                                                                                      |
| Materiali e sostanze adoperate     | Legno, chiodi, tondini in ferro, rete in PVC, fil di ferro.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Analisi dei rischi                 | Abrasioni, tagli, punture, lesioni ai piedi, contatti con le attrezzature, investimento, ribaltamento dei mezzi, caduta di materiale                                                                                                                                                                                                              |
| Procedure esecutive                | Prima di iniziare i lavori, il responsabile di cantiere deve accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei DPI di sicurezza. Gli attrezzi dovranno essere idonei per i lavori cui sono destinati.<br>E' richiesto l'utilizzo di scarpe antinfortunistiche, guanti di protezione, casco e quando necessario cuffie o tappi. |
| Misure di coordinamento            | Effettuare una riunione preliminare, per illustrare al direttore tecnico di cantiere i contenuti del piano di sicurezza e coordinamento, soffermandosi sui punti critici dell'esecuzione dei lavori.                                                                                                                                              |
| Riferimenti legislativi principali | D.LGS. 81/08 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## P.S.C. NUOVA COSTRUZIONE R.S.A. - Comune di Grignasco

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione della fase             | SCAVO DI SBANCAMENTO ED A SEZIONE OBBLIGATA<br>Primo scavo generale di sbancamento relativamente alla parte rampa garage e posti auto seminterrati e relativo scavo a sezione ristretta per la formazione di nuove fondazioni.                                                                                                 |
| Contemporaneità con la/le fase/i   | Nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Attrezzature adoperate             | Pala meccanica e bob-cat, attrezzatura per il convogliamento dei materiali di risulta, autocarro.                                                                                                                                                                                                                              |
| Materiali e sostanze adoperate     | nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Analisi dei rischi                 | Abrasioni, tagli, lesioni, contatti con le attrezzature, elettrocuzioni, inalazione di polveri, rumore.                                                                                                                                                                                                                        |
| Procedure esecutive                | Prima di iniziare i lavori, il responsabile di cantiere deve accertarsi del buon funzionamento delle macchine e delle attrezzature di lavoro e dei DPI di sicurezza.<br>E' richiesto l'utilizzo di scarpe antinfortunistiche, guanti di protezione, casco, occhiali protettivi, mascherine e quando necessario cuffie o tappi. |
| Misure di coordinamento            | Disattivare preventivamente tutti gli impianti dell'edificio, gli scavi devono avvenire con cautela seguendo le indicazioni del capocantiere.<br>Vietare l'accesso ai non addetti ai lavori.                                                                                                                                   |
| Riferimenti legislativi principali | D.LGS. 81/08 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## P.S.C. NUOVA COSTRUZIONE R.S.A. - Comune di Grignasco

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione della fase             | FORMAZIONE DI NUOVE FONDAZIONI<br>Predisposizione di casseri, getto di sottofondazione, armatura delle fondazioni e getto; richiami per muratura in elevazione; disarmo.                                                                         |
| Contemporaneità con la/le fase/i   | Nessuna                                                                                                                                                                                                                                          |
| Attrezzature adoperate             | Attrezzi di uso comune, betoniera/autobetoniera, vibratore                                                                                                                                                                                       |
| Materiali e sostanze adoperate     | Legno, chiodi, fil di ferro, calcestruzzo, ferri di armatura, mattoni tipo Poroton, malta, acqua, cemento, sabbia.                                                                                                                               |
| Analisi dei rischi                 | Schiacciamento per ribaltamento betoniera, contatto con organi motore, eczemi da contatto con cemento, ferite, schegge, tagli, contusioni.                                                                                                       |
| Procedure esecutive                | Usare le scarpe, stivali se occorre, guanti di protezione, casco.<br>Accertarsi della integrità e dell'esistenza delle protezioni fisse della betoniera, l'integrità dei cavi elettrici, il corretto collegamento all'impianto di messa a terra. |
| Misure di coordinamento            | Il getto deve avvenire con cautela seguendo le indicazioni del capocantiere.<br>Vietare l'accesso ai non addetti ai lavori.                                                                                                                      |
| Riferimenti legislativi principali | D.LGS. 81/08 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                            |

## P.S.C. NUOVA COSTRUZIONE R.S.A. - Comune di Grignasco

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione della fase             | ALLESTIMENTO DEL PONTEGGIO METALLICO E SUCCESSIVO SMONTAGGIO<br>Per l'esecuzione dei lavori oltre i 2 mt di altezza è prevista l'installazione di ponteggi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Contemporaneità con la/le fase/i   | Nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Attrezzature adoperate             | attrezzi di uso comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Materiali e sostanze adoperate     | Struttura metallica del ponteggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Analisi dei rischi                 | Caduta materiali dall'alto, caduta dall'alto e in piano, schiacciamento dita, tagli, abrasioni e contusioni alle mani durante il montaggio, lesioni dorso-lombari per la movimentazione manuale dei carichi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Procedure esecutive                | Usare le cinture di sicurezza ed indossare calzature idonee, antisdrucciolevoli; predisporre scale a mano per l'accesso ai vari piani del ponteggio che non devono essere posta una in prosecuzione dell'altra, è vietato salire e scendere lungo i montanti.<br>Proteggere i posti di passaggio sottostanti, allontanare i non addetti ai lavori. Utilizzare chiavi per il serraggio dei bulloni appropriate ed in buono stato di conservazione; non gettare dall'alto gli elementi metallici del ponteggio. Usare le scarpe antinfortunistiche, il casco, i guanti protettivi.<br>Ancorare efficacemente il ponteggio alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti di ancoraggio a rombo, il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici, deve controllare la verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, degli ancoraggi e dei controventi. |
| Misure di coordinamento            | Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisorie devono essere eseguiti da personale pratico sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori seguendo le istruzioni fornite dal fabbricante con l'autorizzazione ministeriale.<br>Prima di erigere il ponteggio verificare il piano di appoggio che deve offrire garanzie sufficienti di resistenza durevole, sistemare i tavoloni per la ripartizione del carico ai quali vanno appoggiate e chiodate le "basette".<br>Verificare costantemente la distanza del ponteggio dalla struttura in costruzione, la verticalità dei montanti ed il loro collegamento assiale.<br>Durante la fase di allestimento del ponteggio devono essere allontanati i non addetti ai lavori di montaggio.                                                                                                                                                                     |
| Riferimenti legislativi principali | D.LGS. 81/08 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## P.S.C. NUOVA COSTRUZIONE R.S.A. - Comune di Grignasco

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione della fase             | FORMAZIONE DI OPERE IN C.A.<br>Piano seminterrato: vano ascensore, pilastri, murature portanti, rampa scala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Contemporaneità con la/le fase/i   | Nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Attrezzature adoperate             | Attrezzi di uso comune, betoniera, vibratore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Materiali e sostanze adoperate     | Legno, chiodi, fil di ferro, calcestruzzo, ferri di armatura, mattoni tipo Poroton, malta, acqua, cemento, sabbia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Analisi dei rischi                 | Movimentazione manuale dei carichi, caduta dall'alto, caduta di materiale dall'alto, schiacciamento per ribaltamento betoniera, contatto con organi motore, eczemi da contatto con cemento, ferite, schegge, tagli, contusioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Procedure esecutive                | Usare le scarpe, guanti di protezione, casco.<br>Accertarsi della integrità e dell'esistenza delle protezioni fisse della betoniera, l'integrità dei cavi elettrici, il corretto collegamento all'impianto di messa a terra.<br>Nei lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 m da terra utilizzare trabattelli ponti su cavalletti regolamentari.<br>Ogni qual volta il carico è superiore a 30 Kg. Devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure. |
| Misure di coordinamento            | I ponti su cavalletti non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni, né sui balconi.<br>Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.<br>I ponti di servizio dovranno essere dotati di cartello indicatore della portata max ammessa al piano. Vietare l'accesso ai non addetti ai lavori.                                                                                                                                          |
| Riferimenti legislativi principali | D.LGS. 81/08 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## P.S.C. NUOVA COSTRUZIONE R.S.A. - Comune di Grignasco

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione della fase             | FORMAZIONE DI MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO IN ELEVAZIONE                                                                                                                                                                                       |
| Contemporaneità con la/le fase/i   | Realizzazione di vespaio areato                                                                                                                                                                                                                  |
| Attrezzature adoperate             | Attrezzi di uso comune, betoniera                                                                                                                                                                                                                |
| Materiali e sostanze adoperate     | Legno, chiodi, fil di ferro, calcestruzzo, ferri di armatura, mattoni tipo Poroton, malta, acqua, cemento, sabbia.                                                                                                                               |
| Analisi dei rischi                 | Schiacciamento per ribaltamento betoniera, contatto con organi motore, eczemi da contatto con cemento, ferite, schegge, tagli, contusioni.                                                                                                       |
| Procedure esecutive                | Usare le scarpe, stivali se occorre, guanti di protezione, casco.<br>Accertarsi della integrità e dell'esistenza delle protezioni fisse della betoniera, l'integrità dei cavi elettrici, il corretto collegamento all'impianto di messa a terra. |
| Misure di coordinamento            | Vietare l'accesso ai non addetti ai lavori.                                                                                                                                                                                                      |
| Riferimenti legislativi principali | D.LGS. 81/08 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                            |

## P.S.C. NUOVA COSTRUZIONE R.S.A. - Comune di Grignasco

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione della fase             | FORMAZIONE DI SOLAI IN LATEROCEMENTO<br>Esecuzione di solai in laterocemento (posizionamento puntelli, cassero di armatura, ferri e getto in calcestruzzo)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Contemporaneità con la/le fase/i   | Nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Attrezzature adoperate             | Attrezzi di uso comune, betoniera, ponteggi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Materiali e sostanze adoperate     | Legno, chiodi, fil di ferro, calcestruzzo, ferri di armatura, puntelli, travetti, malta, acqua, cemento, sabbia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Analisi dei rischi                 | Movimentazione manuale dei carichi, caduta dall'alto, caduta di materiale dall'alto, schiacciamento per ribaltamento betoniera, contatto con organi motore, eczemi da contatto con cemento, ferite, schegge, tagli, contusioni.                                                                                                                                                                                                                    |
| Procedure esecutive                | Usare le scarpe, guanti di protezione, casco.<br>Accertarsi della integrità e dell'esistenza delle protezioni fisse della betoniera, l'integrità dei cavi elettrici, il corretto collegamento all'impianto di messa a terra.<br>Ogni qual volta il carico è superiore a 30 Kg. Devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure. |
| Misure di coordinamento            | Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.<br>I ponti di servizio dovranno essere dotati di cartello indicatore della portata max ammessa al piano. Vietare l'accesso ai non addetti ai lavori.<br>Vietato accedere al piano sottostante la fase lavorativa.                                                                 |
| Riferimenti legislativi principali | D.LGS. 81/08 E S.M.I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## P.S.C. NUOVA COSTRUZIONE R.S.A. - Comune di Grignasco

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione della fase             | FORMAZIONE DI NUOVA COPERTURA<br>Formazione di piccola e grossa orditura in legno, manto di copertura, lattonerie e comignoli di esalazione e camino..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Contemporaneità con la/le fase/i   | Nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Attrezzature adoperate             | attrezzi di uso comune, argano a cavalletto, scale a mano semplici o doppie, ponteggi, sega circolare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Materiali e sostanze adoperate     | Legno, chiodi, tegole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Analisi dei rischi                 | Caduta di persone verso il vuoto, contusioni del capo e delle mani, caduta di materiale dall'alto, tagli, ferite e punture da chiodi, schegge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Procedure esecutive                | Controllare la perfetta efficienza dei dispositivi di protezione della sega circolare.<br>Per il taglio di piccoli pezzi o quando il taglio è alla fine utilizzare gli spingitoi, portapezzi.<br>Usare guanti e cuffie auricolari.<br>Allestire ponteggi esterni, con montanti che superino di almeno mt 1,20 il piano di gronda o l'ultimo impalcato, e impalcato mobili interni.<br>Usare idonee calzature con suole antisdrucciolevoli.<br>Vietare di depositare un numero eccessivo di tegole sul ponteggio, in caso di orditura in legno minuta, procedere alla posa stando su passerelle o tavolati |
| Misure di coordinamento            | La sega circolare deve essere provvista di solida cuffia registrabile, di coltello divisore applicato posteriormente alla lama alla distanza massima di 3 mm, e carter di protezione alla parte della lama sottostante il piano di lavoro.<br>Verificare l'efficienza del collegamento a terra della sega circolare.<br>I parapetti corrispondenti al piano di gronda è opportuno che siano pieni o con correnti ravvicinati.<br>Utilizzare cinture di sicurezza.                                                                                                                                         |
| Riferimenti legislativi principali | D.LGS. 81/08 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## P.S.C. NUOVA COSTRUZIONE R.S.A. - Comune di Grignasco

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione della fase             | FORMAZIONE DI TRAMEZZE<br>Costruzione di tavolati interni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Contemporaneità con la/le fase/i   | Formazione al piano terra e 1 di opere in c.a (vano ascensore e rampa scala)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Attrezzature adoperate             | Trabattelli o ponti su cavalletti, attrezzi di uso comune, betoniera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Materiali e sostanze adoperate     | Malta, mattoni, acqua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Analisi dei rischi                 | Caduta materiali dall'alto, elettrocuzione, schiacciamento per ribaltamento betoniera, contatto con organi motore, eczemi da contatto con cemento, ferite, schegge, tagli, contusioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Procedure esecutive                | Allestire ponti su cavalletti.<br>Sul piano pavimento ben livellato e solido, predisporre appoggi regolari, tavole con sbalzi laterali non superiori a cm 20, accostate fra loro e fissate ai cavalletti di appoggio.<br>Usare le scarpe, guanti di protezione, casco e occhiali.<br>Accertarsi della integrità e dell'esistenza delle protezioni fisse della betoniera, l'integrità dei cavi elettrici, il corretto collegamento all'impianto di messa a terra.<br>Nei lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 m da terra utilizzare trabattelli ponti su cavalletti regolamentari. |
| Misure di coordinamento            | I ponti su cavalletti non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni, né sui balconi.<br>Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.<br>I ponti di servizio dovranno essere dotati di cartello indicatore della portata max ammessa al piano.                                                                                                                                                                                                    |
| Riferimenti legislativi principali | D.LGS. 81/08 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## P.S.C. NUOVA COSTRUZIONE R.S.A. - Comune di Grignasco

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione della fase             | IMPIANTO IDRICO SANITARIO COMPLETO<br>Preparazione e posa delle tubazioni, dei sanitari, dei punti di attacco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Contemporaneità con la/le fase/i   | In contemporanea elettricisti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Attrezzature adoperate             | Filettatrice, piegatubi, flessibile, seghetto elettrico, saldatrice ossiacetilenica, attrezzi d'uso comune (piegatubi, seghetto, tranciatavi, pinza, forbici), attrezzatura per le giunzioni a caldo, scale a mano semplici e doppie, tra battello o ponti su cavalletti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materiali e sostanze adoperate     | Tubi in pvc, tubi in rame rivestiti, minuteria varia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Analisi dei rischi                 | Abrasioni, tagli, contusioni alle mani, schegge, elettrocuzione, inalazione di polveri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Procedure esecutive                | Usare mezzi personali di protezione (occhiali, scarpe, guanti, mascherina antipolvere, otoprotettori, ecc..).<br>Verificare, prima dell'uso, lo stato degli attrezzi di lavoro e degli utensili elettrici (quelli portatili devono essere a doppio isolamento ed essere collegati a quadro di cantiere a norma).<br>Utilizzare utensili elettrici portatili dotati dei dispositivi di sicurezza necessari ed alimentati a bassa tensione.<br>Utilizzare mascherine respiratorie durante la saldatura, applicare sulla derivazione del gas di alimentazione del cannello di saldatura una valvola che impedisca il ritorno di fiamma.<br>Mantenere sempre pulito l'ugello del cannello e conservare le bombole lontane da fonti di calore.<br>Usare scale a mano regolamentari per altezze inferiori a 2 m; nei lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 m da terra utilizzare tra battelli regolamentari o ponti su cavalletti regolamentari. |
| Misure di coordinamento            | Le bombole devono essere efficacemente ancorate ed in posizione verticale per evitare la loro caduta accidentale, per il loro trasporto utilizzare appositi carrelli. Prima dell'esecuzione degli impianti, effettuare una riunione con gli installatori per approntare un programma di lavoro di dettaglio che eviti pericolose interferenze lavorative.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Riferimenti legislativi principali | D.LGS. 81/08 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## P.S.C. NUOVA COSTRUZIONE R.S.A. - Comune di Grignasco

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione della fase             | IMPIANTO ELETTRICO COMPLETO<br>Preparazione e posa delle tubazioni, dei cavi elettrici e scatole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Contemporaneità con la/le fase/i   | In contemporanea idraulici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Attrezzature adoperate             | Attrezzi d'uso comune (seghetto, tranciatavi, pinza, forbici), seghetto elettrico, trapano, scale a mano semplici e doppie, tra battello o ponti su cavalletti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materiali e sostanze adoperate     | Tubi in pvc, cavi elettrici, scatole da frutto e di deviazione, conduttori, apparecchiature.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Analisi dei rischi                 | Abrasioni, tagli, contusioni alle mani, schegge, elettrocuzione, inalazione di polveri, rumore, caduta dall'alto e caduta di materiali dall'alto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Procedure esecutive                | Usare mezzi personali di protezione (occhiali, scarpe, guanti, otoprotettori, ecc).<br>Verificare, prima dell'uso, lo stato degli attrezzi di lavoro e degli utensili elettrici (quelli portatili devono essere a doppio isolamento ed essere collegati a quadro di cantiere a norma).<br>Utilizzare utensili elettrici portatili dotati dei dispositivi di sicurezza necessari ed alimentati a bassa tensione.<br>Usare scale a mano regolamentari per altezze inferiori a 2 m; nei lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 m da terra utilizzare tra battelli regolamentari o ponti su cavalletti regolamentari. |
| Misure di coordinamento            | Prima dell'esecuzione degli impianti, effettuare una riunione con gli installatori per approntare un programma di lavoro di dettaglio che eviti pericolose interferenze lavorative.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Riferimenti legislativi principali | D.LGS. 81/08 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## P.S.C. NUOVA COSTRUZIONE R.S.A. - Comune di Grignasco

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione della fase             | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, SOGLIE E DAVANZALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Contemporaneità con la/le fase/i   | Nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Attrezzature adoperate             | attrezzi di uso comune, taglia piastrelle, betoniera, "miscelatore/impastatrice".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Materiali e sostanze adoperate     | Collanti, sabbia, calce, piastrelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Analisi dei rischi                 | Caduta di materiali dall'alto, schiacciamento delle dita, allergie ai collanti, schegge, tagli alle mani, lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Procedure esecutive                | Durante il taglio delle piastrelle con la taglierina, accertarsi del corretto funzionamento della macchina, dell'integrità dei cavi elettrici, durante l'uso l'operatore dovrà indossare occhiali e otoprotettori.<br>Ogni qualvolta il carico sia superiore a 30 Kg deve essere messa a disposizione delle attrezzature per la movimentazione manuale dei carichi.                                                                                                            |
| Misure di coordinamento            | Durante il trasporto e il sollevamento il manovratore dell'argano a cavalletto non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone, pertanto bisogna provvedere a segnalare ogni operazione in modo da consentire l'allontanamento delle persone. Se persone rimangono sotto i carichi il manovratore dovrà sospendere l'operazione sino al loro allontanamento.<br>Tutte le protezioni rimosse per esigenze di lavoro devono essere ripristinate appena ultimati i lavori |
| Riferimenti legislativi principali | D.LGS. 81/08 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## P.S.C. NUOVA COSTRUZIONE R.S.A. - Comune di Grignasco

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione della fase             | FORMAZIONE DI INTONACO<br>Esecuzione di intonaco rustico e civile per interni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Contemporaneità con la/le fase/i   | Nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Attrezzature adoperate             | Argano a cavalletto, betoniera, attrezzi di uso comune, tra battelli o ponte su cavalletti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Materiali e sostanze adoperate     | Malta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Analisi dei rischi                 | Caduta dall'alto, caduta materiali dall'alto, schiacciamento, abrasioni, contusioni, eczemi da contatto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Procedure esecutive                | Utilizzare i mezzi personali di protezione (occhiali, visiere, guanti, scarpe ecc..)<br>Accertarsi della integrità e dell'esistenza delle protezioni fisse della betoniera, l'integrità dei cavi elettrici, il corretto collegamento all'impianto di messa a terra.<br>Nei lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 m da terra utilizzare trabattelli ponti su cavalletti regolamentari.<br>Ogni qual volta il carico è superiore a 30 Kg. Devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure. |
| Misure di coordinamento            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Riferimenti legislativi principali | D.LGS. 81/08 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## **P.S.C. NUOVA COSTRUZIONE R.S.A. - Comune di Grignasco**

|                                    |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione della fase             | POSA DI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI                                                                                                                         |
| Contemporaneità con la/le fase/i   | Nessuna                                                                                                                                                       |
| Attrezzature adoperate             | attrezzi di uso comune, scale a mano semplici o doppie, ponteggi, trapano elettrico.                                                                          |
| Materiali e sostanze adoperate     | Legno, chiodi, schiuma, collanti.                                                                                                                             |
| Analisi dei rischi                 | Caduta di persone verso il vuoto, contusioni del capo e delle mani, caduta di materiale dall'alto, tagli, ferite e punture da chiodi, schegge.                |
| Procedure esecutive                | Usare guanti.<br>Allestire ponteggi esterni, con montanti che superino di almeno mt 1,20 il piano di gronda o l'ultimo impalcato, e impalcato mobili interni. |
| Misure di coordinamento            |                                                                                                                                                               |
| Riferimenti legislativi principali | D.LGS. 81/08 e s.m.i.                                                                                                                                         |

## P.S.C. NUOVA COSTRUZIONE R.S.A. - Comune di Grignasco

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione della fase             | TINTEGGIATURA INTERNA ED ESTERNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Contemporaneità con la/le fase/i   | Nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Attrezzature adoperate             | attrezzi di uso comune da pittore, cavalletti. ponteggi                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Materiali e sostanze adoperate     | Pittura, vernice, solventi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Analisi dei rischi                 | Caduta di persone verso il vuoto, caduta di materiale dall'alto, possibili danni all'apparato respiratorio, alla cute, agli occhi, al sistema nervoso, all'apparato digerente per l'uso di pitture, vernici e solventi.                                                                                                                          |
| Procedure esecutive                | Usare casco, guanti e mascherine.<br>Allestire ponteggi esterni, con montanti che superino di almeno mt 1,20 il piano di gronda o l'ultimo impalcato, e impalcato mobili interni.<br>Usare idonee calzature con suole antisdrucciolevoli.<br>Consultare, prima dell'uso dei prodotti, le relative schede tossicologiche fornite dal fabbricante. |
| Misure di coordinamento            | I parapetti corrispondenti al piano di gronda è opportuno che siano pieni o con correnti ravvicinati.<br>Utilizzare i dpi in maniera idonea.                                                                                                                                                                                                     |
| Riferimenti legislativi principali | D.LGS. 81/08 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## P.S.C. NUOVA COSTRUZIONE R.S.A. - Comune di Grignasco

|                                    |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione della fase             | SISTEMAZIONE AREA ESTERNA<br>Area verde e parcheggi                                                                                                                 |
| Contemporaneità con la/le fase/i   |                                                                                                                                                                     |
| Attrezzature adoperate             | Pala, piccone, mazza, attrezzi di uso comune (secchi, mazzette, cazzuole, martello, pinze, tenaglie, chiavi), autocarro, scale a mano semplici o doppie, motozappa, |
| Materiali e sostanze adoperate     |                                                                                                                                                                     |
| Analisi dei rischi                 | Abrasioni, tagli, punture, lesioni ai piedi, contatti con le attrezzature, investimento, ribaltamento dei mezzi, caduta di materiale                                |
| Procedure esecutive                | verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate.                                                                              |
| Misure di coordinamento            |                                                                                                                                                                     |
| Riferimenti legislativi principali | D.LGS. 81/08 e s.m.i.                                                                                                                                               |

## P.S.C. NUOVA COSTRUZIONE R.S.A. - Comune di Grignasco

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione della fase             | SMONTAGGIO DEL CANTIERE<br>Smontaggio delle macchine presenti in cantiere, dell'impianto elettrico da cantiere, degli apprestamenti, postazioni fisse, ecc.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Contemporaneità con la/le fase/i   | Nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Attrezzature adoperate             | Pala, piccone, mazza, attrezzi di uso comune, autocarro, scale a mano semplici o doppie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Materiali e sostanze adoperate     | Legno, chiodi, tondini in ferro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Analisi dei rischi                 | Abrasioni, tagli, punture, lesioni ai piedi, contatti con le attrezzature, investimento, ribaltamento dei mezzi, caduta di materiale                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Procedure esecutive                | Allontanare i non addetti ai lavori, lo smontaggio deve essere eseguito da personale pratico e secondo le istruzioni fornite dal costruttore della macchina.<br>Tutti gli elementi del ponteggio non devono essere gettati dall'alto ma devono essere imbragati e calati a terra.<br>Utilizzare i dispositivi di protezione individuale.                                                                 |
| Misure di coordinamento            | Lo smontaggio del ponteggio deve avvenire sotto la diretta sorveglianza di personale pratico dotato di mezzi e attrezzature appropriate.<br>Sotto la zona di lavoro non deve passare nessuno pertanto delimitare la zona di lavoro.<br>Per la rimozione dell'impianto elettrico di cantiere far sezionare completamente dall'ente erogatore dell'energia il quadro generale della rete di distribuzione. |
| Riferimenti legislativi principali | D.LGS. 81/08 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## P.S.C. NUOVA COSTRUZIONE R.S.A. - Comune di Grignasco

### INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

(2.1.2 lett. e) e lett. i); 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3)\*

Descrivere i rischi di interferenza individuati in seguito all'analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere indicando le procedure per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali rischi non possano essere eliminati o permangano rischi residui vanno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo tali rischi.

### CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

(il tempo in relazione alla complessità del progetto può essere espresso in gg, sett., o inizialmente anche in mesi salvo successivo dettaglio)

ENTITA' PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO : \_ \_circa 3 mesi distribuiti su più anni\_\_\_\_\_

| Tempo<br>Fasi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Note |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|------|
| N. 1          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |      |
| N. 2          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |      |
| N. 3          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |      |
| N. 4          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |      |
| N. 5          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |      |
| N. 6          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |      |
| N. 7          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |      |
| N. 8          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |      |
|               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |      |
|               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |      |

Vi sono interferenze tra le lavorazioni: **NO X**  
(anche da parte della stessa impresa  
o lavoratori autonomi)

SI ☐



| N   | FASE INTEFERENZA LAVORAZIONI | Sfasamento<br>Spaziale   | Sfasamento<br>Temporale | PRESCRIZIONI OPERATIVE |
|-----|------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1   |                              | <input type="checkbox"/> | X                       |                        |
| 2   |                              | <input type="checkbox"/> | X                       |                        |
| 3   |                              | <input type="checkbox"/> | X                       |                        |
| ... |                              | <input type="checkbox"/> | X                       |                        |

| N   | Misure preventive e protettive da<br>attuare | Dispositivi di protezione da<br>adottare | Soggetto attuatore | Note |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------|
| 1   |                                              |                                          |                    |      |
| 2   |                                              |                                          |                    |      |
| 3   |                                              |                                          |                    |      |
| ... |                                              |                                          |                    |      |

## P.S.C. NUOVA COSTRUZIONE R.S.A. - Comune di Grignasco

### PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS

(2.1.3)\*

*Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o più specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS dell'impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono comprendere elementi che costituiscono costo della sicurezza e vanno successivamente validate all'atto della verifica dell'idoneità del POS.*

Sono previste procedure: ☐ sì ☐ no

Se sì, indicazioni a seguire:

| N   | Lavorazione | Procedura | Soggetto destinatario |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
| 1   |             |           |                       |
| 2   |             |           |                       |
| 3   |             |           |                       |
| ... |             |           |                       |

## P.S.C. NUOVA COSTRUZIONE R.S.A. - Comune di Grignasco

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |
| SCHEDA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |
| <b>Fase di pianificazione</b><br>(2.1.2 lett.f)*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> apprestamento<br><input type="checkbox"/> infrastruttura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> attrezzatura<br><input type="checkbox"/> mezzo o servizio di protezione collettiva |
| <b>Descrizione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |
| <b>Fase/i d'utilizzo o lavorazioni:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| <b>Misure di coordinamento (2.3.4.):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |
| <b>Fase esecutiva</b><br>(2.3.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |
| <b>Soggetti tenuti all'attivazione</b><br>1.- <input type="checkbox"/> Impresa Esecutrice :<br>2.- <input type="checkbox"/> Impresa Esecutrice :<br>3.- <input type="checkbox"/> Impresa Esecutrice :<br>4.- <input type="checkbox"/> Impresa Esecutrice :<br><br>5.- <input type="checkbox"/> L.A. :<br>6.- <input type="checkbox"/> L.A. :<br>7.- <input type="checkbox"/> L.A. :<br>8.- <input type="checkbox"/> |                                                                                                             |
| <b>Cronologia d'attuazione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
| <b>Modalità di verifica:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |
| Data di aggiornamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | il CSE<br>.....                                                                                             |

## P.S.C. NUOVA COSTRUZIONE R.S.A. - Comune di Grignasco

### MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO

(2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g) ) \*

*Individuare tempi e modalità della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare per garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere.*

- ☐ Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti
- ☐ Riunione di coordinamento
- ☐ Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi
- ☐ Altro (descrivere)

### DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

(2.2.2 lett.f) ) \*

*Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare l'avvenuta consultazione del RLS prima dell'accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso.*

- ☐ Evidenza della consultazione :
- ☐ Riunione di coordinamento tra RLS :
- ☐ Riunione di coordinamento tra RLS e CSE :
- ☐ Altro (descrivere)

### ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

(2.1.2 lett. h)) \*

#### Pronto soccorso:

- ☐ a cura del committente:
- ☐ gestione separata tra le imprese:
- ☐ gestione comune tra le imprese:

In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attività di cantiere:

#### Emergenze ed evacuazione :

##### Numeri di telefono delle emergenze:

Pronto soccorso più vicino:

Vigili del fuoco:

...

*Individuare le procedure di intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in particolare tutte quelle situazioni in cui sia non sia agevole procedere al recupero di lavoratori infortunati (scavi a sezione obbligata, ambienti confinati, sospensione con sistemi anticaduta, elettrocuzione, ecc.).*

## P.S.C. NUOVA COSTRUZIONE R.S.A. - Comune di Grignasco

### STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(4.1)\*

Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell'allegato XV del d.lgs. n. 81/2008, ed in base a quanto indicato nel presente PSC

| n  | Descrizione                                                                                                                              | Dettaglio                                                                                                       | Totale |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC                                                                                                           | Recinzione                                                                                                      |        |
| 2  | MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTE NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI   | Uso dpi                                                                                                         |        |
| 3  | IMPIANTI DI TERRA                                                                                                                        | Impianti con quadro generale per mesi di lavoro                                                                 |        |
| 4  | IMPIANTI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE                                                                                                 |                                                                                                                 |        |
| 5  | IMPIANTI ANTINCENDIO                                                                                                                     | Estintori polvere                                                                                               |        |
| 6  | MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA                                                                                                 | Noleggio piattaforma<br>Tra battello<br>Porzione di ponteggio verifica e progetto                               |        |
| 7  | PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA                                                                 |                                                                                                                 |        |
| 8  | EVENTUALI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI        |                                                                                                                 |        |
| 9  | MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA |                                                                                                                 |        |
| 10 | ATTIVITA DI COORDINAMENTO RIUNIONI PERILIMINARI E SOPRALLUOGHI                                                                           | Sopralluoghi e riunioni/coordinamento preliminari<br>verifica documentazione ditte e integrazione eventuale PSC |        |
|    |                                                                                                                                          |                                                                                                                 |        |

### ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI

- X planimetria / lay out di cantiere in funzione dell'evoluzione dei lavori;
- ☐ planimetrie di progetto, profilo altimetrico;
- ☐ relazione idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso;
- ☐ computo metrico analitico dei costi per la sicurezza;
- ☐ tavola tecnica sugli scavi (ove necessaria)
- ☐ \_\_\_\_\_

**QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE**

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento è composta da n. \_\_\_\_\_ pagine.

1. Il C.S.P. trasmette al Committente \_\_\_\_\_ il presente PSC per la sua presa in considerazione.

**Data** \_\_\_\_\_

**Firma del C.S.P.** \_\_\_\_\_

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.

**Data** \_\_\_\_\_

**Firma del committente** \_\_\_\_\_

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC

Il presente documento è composta da n. \_\_\_\_\_ pagine.

3. L'impresa affidataria dei lavori Ditta \_\_\_\_\_ in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato:

☐ non ritiene di presentare proposte integrative;

☐ presenta le seguenti proposte integrative \_\_\_\_\_

**Data** \_\_\_\_\_

**Firma** \_\_\_\_\_

4. L'impresa affidataria dei lavori Ditta \_\_\_\_\_ trasmette il PSC / PSC aggiornato alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:

a. Ditta \_\_\_\_\_

b. Ditta \_\_\_\_\_

c. Sig. \_\_\_\_\_

d. Sig. \_\_\_\_\_

**Data** \_\_\_\_\_

**Firma** \_\_\_\_\_

5. Le imprese esecutrici (*almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori*) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

**Data** \_\_\_\_\_

**Firma della Ditta** \_\_\_\_\_

6. Il rappresentante per la sicurezza:

☐ non formula proposte a riguardo;

☐ formula proposte a riguardo \_\_\_\_\_

**Data** \_\_\_\_\_

**Firma del RLS** \_\_\_\_\_
